

张家口市河山汇德建材有限公司
混凝土搅拌站技改项目
竣工环境保护验收报告

建设单位：张家口市河山汇德建材有限公司

编制单位：张家口市河山汇德建材有限公司

2023 年 12 月

建设单位法人代表：李春辉

项 目 负 责 人：唐清明

建设单位：张家口市河山汇德

建材有限公司（盖章）

电话：15612313637

传真：

邮编：075000

地址：张家口市桥西区马家梁

村西 1.5km 处

编制单位：张家口市河山汇德

建材有限公司（盖章）

电话：15612313637

传真：

邮编：075000

地址：张家口市桥西区马家梁

村西 1.5km 处

目 录

前言	1
1、验收编制依据	3
1.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	3
1.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	3
1.3 工程技术文件及批复文件	4
2、工程概况	5
2.1 项目基本情况	5
2.2 建设内容	6
2.3 工艺流程	8
2.4 劳动定员及工作制度	10
2.5 公用工程	11
2.6 环评审批情况	12
2.7 项目投资	13
2.8 项目变动情况	13
2.9 环境保护“三同时”落实情况	13
2.10 验收范围及内容	15
3、主要污染源及治理措施	17
3.1 施工期污染源及治理措施	17
3.2 运营期污染源及治理措施	18
4、环评主要结论及环评批复要求	23
4.1 环境影响报告书（表）主要结论与建议	23
4.2 审批部门审批意见	24
4.3 审批意见落实情况	26
5、验收执行标准	28
5.1 污染物排放执行标准	28
5.2 主要污染物总量控制指标	28
6、质量保证措施和监测分析方法	30
7、验收检测结果及分析	31

7.1 污染物排放检测结果	31
7.2 污染物排放总量核算	31
8、环境管理检查	32
8.1 环保管理机构	32
8.2 施工期环境管理	32
8.3 运行期环境管理	32
8.4 社会环境影响情况调查	32
8.5 环境管理情况分析	32
9、结论和建议	33
9.1 项目验收结论	33
9.2 建议	34

前言

本项目为张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目，由张家口市河山汇德建材有限公司建设，建设地点位于张家口市桥西区马家梁村西 1.5km 处。2014 年 3 月委托张家口市环境科学研究院编制了《张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站项目》环境影响报告表，并于 2014 年 4 月 3 日通过了张家口市环境保护局桥西分局的批准，2018 年 8 月通过了张家口市行政审批局的验收，验收文号是张行审立字【2018】484 号。

张家口市颐兴建筑材料有限公司于 2005 年 3 月 15 日委托张家口市环境保护研究所编制了《张家口市颐兴建筑材料有限公司混凝土搅拌站项目》环境影响报告表，并于 2005 年 4 月 12 日通过了张家口市环境保护局的审批；并于 2006 年 7 月 3 日通过了张家口市环境保护局桥西分局的验收；2013 年 5 月张家口市河山汇德建材有限公司与张家口市颐兴建筑材料有限公司通过友好协商，将该项目所有设备及厂房转让给张家口市河山汇德建材有限公司。张家口市河山汇德建材有限公司于 2010 年 2 月 8 日取得张家口市环境保护局桥西分局建设项目环境影响登记表审批意见，登记内容为建设单位由张家口市颐兴建筑材料有限公司变更为张家口市河山汇德建材有限公司，法人由李金福变更为何荣山，其他不变。2021 年 12 月张家口市河山汇德建材有限公司委托有资质公司编制了《张家口市河山汇德建材有限公司改建危废储存间项目》环境影响报告表，并于 2021 年 2 月 8 日取得张家口市行政审批局审批意见，张行审立字【2021】73 号。2021 年 9 月 17 日取得改建危废间项目竣工环境保护验收的备案回执，备案号：2021Y-281 号。

因原项目运行年代久远，生产设备落后，因此张家口市河山汇德建材有限公司拟投资 800 万元，对原项目进行技改建设。2023 年 11 月 20 日，张家口市桥西区行政审批局，以西行审核字【2023】118 号，出具企业投资项目备案信息。

2023 年 11 月，张家口市河山汇德建材有限公司委托张家口昊峰环保科技有限公司编制了《张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目环境影响报告表》，并于 2023 年 12 月 08 日取得张家口市行政审批局关于项目环境影响报告表的审批意见（张行审立字【2023】628 号）。同意建设单位按照环评文件

要求进行建设。

目前项目已建设完成。张家口市河山汇德建材有限公司按照《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（冀环办字函（2017）727号）文件要求，开展竣工环境保护验收工作。并编制完成了《张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目竣工环境保护验收报告》。

由于本项目为混凝土搅拌项目，项目建设完成后已进入冬季，无法正式运行，公司目前处于停产状态。因此，项目污染源无法满足验收监测条件。

本次验收内容仅包含《张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目环境影响报告表》中涉及的环保设施，我公司承诺待项目后期正常运行后，对废气及噪声污染源进行补充监测。

报告编制过程中得到了张家口市行政审批局、张家口市生态环境局桥东区分局等单位 and 人员的大力帮助和支持，在此一并致谢！

1、验收编制依据

1.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订施行）；
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起实施）；
- (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订施行）；
- (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订施行）；
- (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修改）；
- (7) 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；
- (8) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；
- (9) 《河北省生态环境保护条例》（2020年7月1日起施行）。

1.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
- (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；
- (3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；
- (4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
- (5) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；
- (6) 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
- (7) 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
- (8) 《地下水质量标准》（GB/14848-2017）；
- (9) 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；
- (10) 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）；
- (11) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
- (12) 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；
- (13) 《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部）；

(14) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部 2018.5.16 发布）；

(15) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；国环规环评〔2017〕4号；

(16) 《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》；冀环办字函〔2017〕727号。

1.3 工程技术文件及批复文件

(1) 张家口昊峰环保科技有限公司编制的《张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目环境影响报告表》（2023.11）；

(2) 张家口市行政审批局关于《张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目环境影响报告表》的审批意见：张行审立字【2023】628号。

(3) 张家口市河山汇德建材有限公司提供的其他相关资料。

2、工程概况

2.1 项目基本情况

项目名称	张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目			
项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 技改 <input checked="" type="checkbox"/>			
建设单位	张家口市河山汇德建材有限公司			
建设地点	张家口市桥西区马家梁村西 1.5km 处			
法人代表	李春辉	联系人	唐清明	15612313637
建设规模	年产混凝土 23 万立方米			
环评时间	2023 年 12 月	开工日期	2023 年 12 月	
竣工时间	2024 年 01 月	现场监测时间	/	
环评报告审批部门	张家口市行政审批局	环评报告编制单位	张家口昊峰环保科技有限公司	
环评形式	报告表	环评批文号	张行审立字【2023】628 号	
环保设施设计单位	/			
环保设施施工单位	/			
总投资概算	800 万元	环保投资概算	40 万元	
实际总投资	800 万元	实际环保投资	40 万元	
项目建设情况	张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目建设地点位于张家口市桥西区马家梁村西 1.5km 处，项目在原有厂区内建设，不新增占地面积，主要建设内容为替换原 HZS120 搅拌主机一台，升级改造为 HZS180 搅拌主机，其他配套设施均利旧。项目技改后项目厂区共布设 HZS180 商品混凝土生产线 2 条。目前主体工程及环保工程已经施			

	工完毕，具备竣工验收条件。
--	---------------

2.2 建设内容

本项目为技改项目，主要建设内容为替换原 HZS120 搅拌主机一台，升级改造为 HZS180 搅拌主机，其他配套设施均利旧。

2.2.1 项目组成

根据项目实际建设情况，对照环境影响报告表拟建设情况，列表如下。

表 2-1 项目主要建设内容对照一览表

序号	项目组成		环境影响报告表要求建设情况		项目实际建设情况	变动情况
			建设规模	备注		
1	主体工程	混凝土生产线	替换原 HZS120 搅拌主机一台，升级改造为 HZS180 搅拌主机。项目技改后项目厂区共布设 HZS180 商品混凝土生产线 2 条	年产混凝土 23 万立方米	与环评一致	无变动
2	储运工程	原料库	钢结构厂房 2 座，用于储存砂石料等原料	利旧	与环评一致	无变动
		筒仓	厂区设置 4 座 200t 的粉煤灰储罐和 4 座 200t 的水泥储罐	利旧	与环评一致	无变动
3	辅助工程	办公及生活用房	砖混结构、建筑面积约 800 平方米	利旧	与环评一致	无变动
		检验室	建筑面积 150 平方米用于原料及产品的检测	利旧	与环评一致	无变动
4	公用工程	供电工程	接市政电网	利旧	与环评一致	无变动
		给水工程	附近村庄提供	利旧	与环评一致	无变动
		排水工程	生产废水经沉淀池沉淀后循环利用不外	利旧	与环评一致	无变动

			排；生活污水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕			
		供热工程	项目冬季不生产，无需供热	/	与环评一致	无变动
5	环保工程	废气治理	①项目砂石料全部为外购，运至厂区内原料库密闭储存，原料库设喷淋装置，并定期洒水抑尘，厂区地面硬化，定期洒水；②砂石料输送采用密闭传送带；③筒仓呼吸粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后外排；④搅拌楼搅拌粉尘经布袋除尘器处理后外排；	/	与环评一致	无变动
		废水治理	①厂区生产废水主要为车辆及设备清洗废水，经沉淀池沉淀处理后循环利用不外排；②职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厂区设置防渗旱厕，旱厕定期清掏	/	与环评一致	无变动
		噪声治理	选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声	/	与环评一致	无变动
		固废治理	①除尘器收集的粉尘回用于生产；②沉淀池沉淀砂石经收集后回用于生产；③废混凝土试块外售作路面铺垫料；④生活垃圾由环卫部门清运处理；⑤项目设置危废间 10 平方米，设备修	/	与环评一致	无变动

			护保养产生的废机油、废机油桶暂存于危废间，交由有资质单位处置。			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--

2.2.2 主要生产设备

项目主要生产设备见表 2-2。

表 2-2 本项目主要设备一览表

名称	主要设备名称	型号	单位	数量	备注
混凝土生产线	搅拌机	180 型	台	1	新增
	搅拌机	180 型	台	1	利旧
	粉料罐	200t	座	8	利旧
	骨料仓	7000/6500	座	2	利旧
	生产蓄水池	/	个	2	利旧
	仓顶布袋除尘器	--	套	7	利旧
	洗轮机	--	套	2	利旧
	砂石分离机	--	套	1	利旧
	混凝土罐车	15m ³	辆	15	利旧
	泵车	/	辆	5	利旧
	地磅	150 吨	套	1	利旧

2.2.3 主要原辅材料及能源消耗

工程原辅材料及能源消耗一览表见表 2-3。


表 2-3 原有工程主要原辅材料消耗一览表

序号	原辅料	年用量	来源描述
1	水泥	6.6 万吨	外部购进
2	石子	20 万吨	
3	沙子	20 万吨	
4	粉煤灰	2.2 万吨	
5	矿粉	2.0 万吨	

6	水泥外加剂	0.2 万吨	
7	水	3.3 万吨/年	附近村庄供水
8	电	10 万 kWh/年	箱式变压器

2.3 工艺流程

本项目运营期生产工艺流程如下：

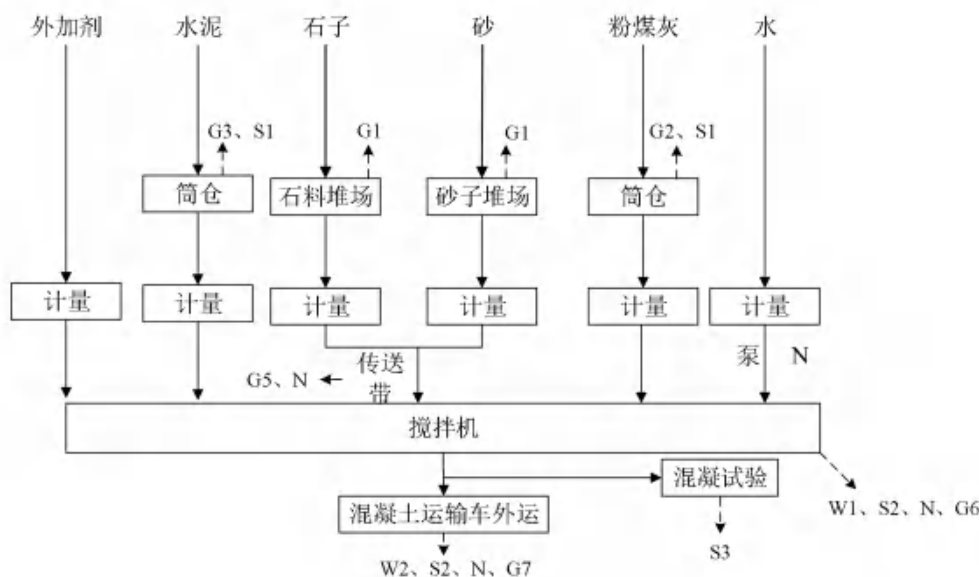

图例：G 废气，W 废水，S 固体废物，N 噪声

图 2-1 工艺流程及排污节点图

工艺说明：

(1) 原料的运输与储存

生产所用石子、砂子、水泥、粉煤灰及外加剂均为外购，汽车运输至本厂区，石子、砂子由汽车运至厂区原料库储存，此过程产生粉尘 G1。水泥、粉煤灰分别存放于水泥、粉煤灰筒仓，外加剂进罐储存。此过程产生的主要污染物为粉煤灰与水泥筒仓呼吸粉尘 G2、G3 及设备除尘器收集粉尘 S1。

(2) 配料

砂子、碎石从堆料场运至储料斗，储料斗下部设置闭合电控装置，根据配料比例将砂子、碎石卸入下部的皮带输送机，经皮带送至配料斗，通过链条提升装置将其导入搅拌机，同时，通过自动控制设备将水泥、粉煤灰、外加剂和水泵送至搅拌机内。此过程产生的主要污染物为配料粉尘 G5 及设备运行噪声 N。

(3) 搅拌、卸料

原料送至搅拌机后，搅拌主机不断旋转，使原料均匀混合得到混凝土产品，搅拌完成后将产品卸入下方的混凝土搅拌车内，再进行设备清洗。此过程产生的主要污染物为搅拌粉尘 G6、设备清洗废水 W1、除尘器收集粉尘 S1、沉淀泥渣 S2 以及设备运行噪声 N。

(4) 混凝土试验

本项目实验室仅进行简单的配合比实验和成品抽样检测实验，均为物理实验，不涉及化学品的使用。此过程会产生废混凝土试块 S3。

(5) 混凝土运输

混凝土搅拌车将产品送至订购单位处(为了防止混凝土凝结，罐体不断旋转)，回厂后罐车需进行清洗。此过程产生的主要污染物为车辆清洗废水 W2、车辆运输噪声 N 以及运输车辆扬尘 G7。

表 2-3 技改项目建成后全厂主要产排污节点一览表

类别	产生节点	污染物	采取的措施及去向
废气	筒仓呼吸	颗粒物	经脉冲除尘器处理后高空排放
	砂石料储存		车间密闭，水喷淋
	计量配料		输送带密闭处理
	搅拌		经脉冲除尘器处理后高空排放
	运输车辆扬尘		道路保洁、洒水抑尘
	备用柴油发电机	CO、NO _x 、SO ₂ 等	使用频率较低
废水	生活污水(盥洗废水)	COD、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	盥洗废水泼洒抑尘，职工使用厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏。
	设备、车辆清洗废水	SS	经沉淀池处理后回用
噪声	生产过程	设备噪声	设备减振、厂房隔声、距离衰减
固废	设备、车辆清洗	沉淀池泥渣	回用于生产
	筒仓呼吸	除尘器收集粉尘	
	搅拌		
	混凝土试验	废混凝土试块	运至建筑垃圾场
	职工生活	生活垃圾	经收集后交环卫部门处理

2.4 劳动定员及工作制度

本次技改不新增劳动定员，厂区现有劳动定员 30 人，劳动制度实行每天一

班制，每班工作时间 8 小时，年生产时间为 240 天。

2.5 公用工程

2.5.1 给排水

本技改项目完成后，厂区用水平衡如下。

①生活用水

厂区劳动定员为 30 人，年工作 240 天，参照河北省地方标准《生活与服务用水定额 第一部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）员工用水量以 22L/人·d 计，则该项目职工生活用水量为 0.66t/d（158.4t/a）。废水量按新鲜水的 80% 计，则生活污水产生量为 126.72t/a，生活污水排入防渗旱厕，交由环卫部门处置。

②降尘用水

为了降低厂区粉尘对周边环境的影响，需对厂区道路、装卸点等进行洒水降尘、定期清扫除尘，类比同类项目，用水量约为 2t/d，年工作 240d，则抑尘用水量为 480t/a。厂区抑尘用水全部蒸发损耗不外排。

③混凝土搅拌用水：根据建设单位提供资料，生产配料用水量约为 30995t/a。配料用水与原料混合后，进入成品中，无废水产生。

④设备清洗用水：混凝土生产线搅拌机在每天暂停生产时应进行清洗，约每天清洗一次，每次清洗用水量约为 1.5t/次，则搅拌机清洗用水量约为 1.5t/d（375t/a）。设备清洗废水按用水量的 80% 计，则设备清洗废水产生量为 1.2t/d（300t/a），经沉淀池沉淀后回用于车辆清洗及厂区洒水抑尘，不外排。

⑤车辆冲洗用水：项目商品混凝土年销售量为 23 万立方米，单车一次运输量最大为 12 立方，则每年约需运输 19166 辆·次，即 79.85 辆·次/d（年营运 240 天），运输车辆每次运输出厂时均需进行冲洗。本项目在厂区设置沉淀池用于车辆清洗。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）中表 3.2.7 汽车冲洗最高日用水定额，本项目按照循环用水冲洗补水 50L/辆·次计，则车辆清洗用水量为 3.99t/d（957.6t/a）。车辆清洗废水按用水量的 80% 计，则车辆清洗废水产生量为 3.192m³/d（766.08m³/a），经沉淀池沉淀后循环使用不外排。

⑥化验室用水：本项目设有化验室，为混凝土物理性质检验，化验室中试验器具的清洗和混凝土养护会产生废水，根据企业提供资料，本项目化验室用水量

约 1m³/d (240m³/a)。废水产生量按 80%计，则化验室废水产生量为 0.8m³/d (192m³/a)，主要污染因子为 SS，直接排入沉淀池沉淀后用于车辆清洗及厂区抑尘用水。

项目水平衡图如下。

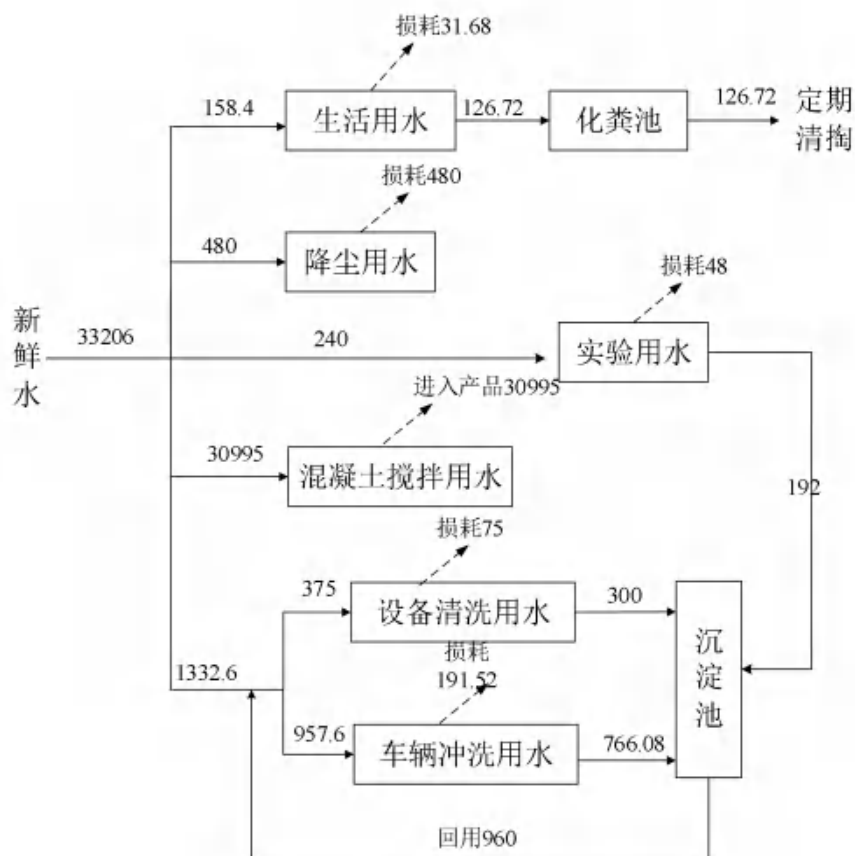


图 2-2 项目水平衡图 (单位: t/a)

2.5.2 供电

现有厂区用电由市政供电所提供。

2.5.3 供热

项目冬季不生产，无需供热。

2.6 环评审批情况

2023 年 11 月，张家口市河山汇德建材有限公司委托张家口昊峰环保科技有限公司编制了《张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目环境影响

报告表》，并于2023年12月08日取得张家口市行政审批局关于项目环境影响报告表的审批意见（张行审立字【2023】628号）。

2.7 项目投资

本项目计划总投资800万元，其中环保投资40万元，占总投资的5%。项目实际总投资800万元，其中环保投资40万元，占总投资的5%。

2.8 项目变动情况

经现场调查和建设单位核实，项目建设内容、设备、公用工程、环保措施均与报告表基本一致，无重大变更。

2.9 环境保护“三同时”落实情况

本项目环境影响报告表及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表2-6。

表 2-6 项目三同时落实情况一览表

类别	污染源	环评措施	验收标准	落实情况
废气	180型搅拌机排气筒 DA001	袋式除尘器，15m高排气筒	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020） 表1大气污染物最高允许排放浓度限值 散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备： 颗粒物排放浓度 \leq 10mg/m ³	本项目搅拌机组已按照环评要求装设除尘设施，但由于冬季公司处于停产状态，因此项目污染源无法满足验收监测条件，待项目后期正常运行后，对废气污染源进行补充监测。
	180型搅拌机排气筒 DA002	袋式除尘器，15m高排气筒		
	1#水泥筒仓	仓顶滤芯除尘器		已落实，项目筒仓为密闭筒仓，仓内负压工作环境，粉料入仓粉尘经仓顶脉冲式除尘器收集，经脉冲震荡后回落于料筒中用于产品，筒仓废气为瞬时排放，不具备监测条件。
	2#水泥筒仓	仓顶滤芯除尘器		
	1#粉煤灰筒仓	仓顶滤芯除尘器		
	2#粉煤灰筒仓	仓顶滤芯除尘		

		器		
	3#水泥筒仓	仓顶脉冲除尘器		
	4#水泥筒仓	仓顶脉冲除尘器		
	3#粉煤灰筒仓	仓顶脉冲除尘器		
	4#粉煤灰筒仓	仓顶脉冲除尘器		
	厂界废气	原料库密闭，喷淋洒水；厂区地面采取硬化措施，并定时洒水清扫；采用密闭传送带。	《水泥工业大气污染物超低排放标准》 (DB13/2167-2020) 表 2 大气污染物无组织排放限值：颗粒物 $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^3$	本项目已按照环评要求对原料库密闭，喷淋洒水；厂区地面采取硬化措施，并定时洒水清扫；采用密闭传送带，但由于冬季公司处于停产状态，因此厂界废气无法满足验收监测条件要求，待项目后期正常运行后，对厂界废气进行补充监测。
废水	生活污水	盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，职工使用厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏	/	已落实，防渗旱厕定期清掏
	生产废水	经沉淀池沉淀后循环使用不外排	/	已落实，项目搅拌设备清洗废水及车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用
噪声	设备噪声	低噪声设备，基础减振，厂房隔声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中的 2 类标准	本项目已按照环评要求选用低噪声设备，基础减振，但由于冬季公司处于停产状态，因此厂界噪声无法满足验收监测条件，待项目后期正

				常运行后，对厂界噪声进行补充监测。
固废	除尘器收集粉尘	回用于生产	/	已落实
	沉淀砂石	收集后回用于生产	/	
	废混凝土试块	经手动破碎后，统一收集后回用于生产	/	
	生活垃圾	由环卫部门清运处理	/	

2.10 验收范围及内容

本项目为张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目，由张家口市河山汇德建材有限公司建设，建设地点位于张家口市桥西区马家梁村西 1.5km 处。项目主要建设内容为：替换原 HZS120 搅拌主机一台，升级改造为 HZS180 搅拌主机，其他配套设施均利旧。项目建成后生产规模为年产混凝土 23 万立方米。

项目主体工程及配套环保设施已经建设完成：搅拌机组废气经袋式除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放，筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后不低于 15m 排气口排放，原料库密闭，喷淋洒水；厂区地面采取硬化措施，并定时洒水清扫；采用密闭传送带；职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，职工使用厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏；设备采用减振隔声等措施，固废均妥善处置。

本项目已按照环评文件及审批要求安装环保设施，但由于冬季公司处于停产状态，因此污染源无法满足验收监测条件，待项目后期正常运行后，对废气及噪声进行补充监测。

因此，本次验收范围为《张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目环境影响报告表》中设施内容，包括：

(1) 废气——通过现场检查了解项目搅拌机组粉尘、筒仓粉尘、厂区无组织粉尘治理措施设置情况；

(2) 废水——通过现场检查了解项目生活污水排放情况；

(3) 噪声——通过现场检查了解设备是否位于厂房内，采取减振隔措施；

(4) 固体废物——通过现场检查了解固体废物收集、贮存和处置是否符合相关规定；

(5) 工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等。

3、主要污染源及治理措施

3.1 施工期污染源及治理措施

本项目在张家口市桥西区马家梁村西 1.5km 处张家口市河山汇德建材有限公司厂区内，施工期主要为设备拆除及设备安装调试，施工期间不可避免地会对环境带来一定的影响，但施工期施工内容相对简单，施工量较小，施工期较短，采取相应措施后对周围环境影响较小。

(1) 施工废气污染防治措施

项目在施工期采取如下废气防治措施：

- ①施工现场建立洒水清扫制度，定期洒水抑尘；
- ②运输车辆在厂区内行驶时降低车速；
- ③对运载项目设备的车辆加盖篷布，车辆行驶线路避开居民区。

(2) 施工废水污染防治措施

本项目施工期废水主要为施工现场车辆冲洗水及施工人员生活废水。为避免施工期废水排放污染当地水体环境，公司采取以下处理措施：

- ①车辆冲洗废水及施工废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。
- ②施工场地盥洗污水用于场地泼洒抑尘。
- ③加强管理方式，实施工地节约用水，减少项目施工污水的排放。

(3) 施工噪声污染防治措施

施工期间建设过程中噪声主要来源于施工机械及运输车辆噪声，项目建设过程中采取下列噪声污染防治措施：

①使用低噪声机械设备，设置专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②合理布局施工场地；

③施工机械的作业时间在 7：00 至 12：00，14：00 至 22：00 时，夜间不施工。

(4) 施工期固体废物污染防治措施

施工期主要为设备安装，施工过程中产生的固体废弃物主要为施工人员生活垃圾，厂区内设置垃圾收集装置，生活垃圾经分类收集后交由环卫部门定期处置。

综上，本项目施工期间产生的扬尘、固体废物和噪声污染、施工期施工人员产生和排放的施工废水和生活污水均得到合理处置，对周边环境影响较小。

3.2 运营期污染源及治理措施

3.2.1 大气污染源及治理措施

本技改项目主要对厂区现有环保设施进行改造，改造完成后，全厂运营过程中产生的废气主要为①原料运输、堆卸粉尘、配料粉尘；②筒仓呼吸粉尘；③搅拌粉尘。

①原料运输、堆卸粉尘、配料粉尘

项目原料及成品运输车辆在校区内行驶时会产生一定量的扬尘。为防治运输扬尘污染，厂区及道路进行绿化硬化，项目易起尘物料运输时加强覆盖，运输车辆在厂区内缓速慢行，车辆进出厂时进行轮胎冲洗，厂区定时清扫洒水。采取措施后由于车辆运输所产生的扬尘量较小。

本项目所用砂石料为外购，由自卸车辆运至密闭原料库暂存，受风力扰动较小。原料库为全封闭结构，留设车辆出入大门。车间内采取喷淋洒水措施保持物料表面湿润，因此物料堆存粉尘产生量较小。

厂区堆场中的骨料由装卸机送料至骨料仓，计量好的骨料经搅拌站配套的密闭皮带输送至搅拌主楼的储料斗进入搅拌机内。水泥、矿渣粉等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤送料，称重完物料直接进入搅拌机搅拌，因此粉料配料过程粉尘产生量较少。

②筒仓呼吸粉尘

项目粉状原料由专用罐车运至厂内，通过气力输送至密封筒仓内，由于受气流冲击，粉状原料可从筒仓顶气孔排至大气中。本项目建设完成后厂区共设置8个粉料筒仓。配备4个水泥筒仓和4个粉煤灰筒仓，仓顶均配备滤芯除尘器。项目每个筒仓负压工作，粉料入仓时产生的粉尘均经仓顶密闭式收尘器处理，收集的粉尘经脉冲震荡后回落于料筒中用于产品，外排粉尘量极少。

③搅拌粉尘

本项目共设置2台搅拌机，项目每台搅拌机组配套设置1套袋式除尘器，搅拌粉尘经袋式除尘器处理后高空排放。

④备用柴油发电机废气

本厂区设置备用柴油发电机作为应急电源。柴油发电机运行过程中会产生燃烧废气，但由于备用发电机组使用频率较低，只要严格按照要求操作，控制好燃烧状况，柴油发电机废气不会对周围环境产生较大影响。





图 3-1 项目环保实施现场照片

3.2.2 废水污染源及治理措施

本技改项目无新增废水产生。厂区现有废水主要为生活污水及清洗废水。生活污水主要为职工盥洗废水，盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，职工使用厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏。设备清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排。

项目厂区防渗旱厕及沉淀池照片如下。



图 3-3 项目沉淀池照片

3.2.3 噪声

本项目营运期噪声主要为搅拌主机、铲车、皮带输送机等设备运行产生的噪声，采取基础减震后噪声源强为 70~90dB (A) 之间。项目在满足工艺的前提下，尽可能选用功率小、噪声低的设备，采用厂房隔声等措施，合理布置设备位置。采取以上措施后可有效减轻噪声对周围环境的影响。

3.2.4 固体废物

本技改项目现有工程固体废物主要为除尘器收集粉尘、沉淀池泥渣、废混凝土试块及职工生活垃圾。

除尘器收集的粉尘回用于生产；沉淀池沉淀砂石经收集后回用于生产，底泥晾干后可作为填方材料外运处理；废混凝土试块收集后外售可作为道路建设的路面铺垫料，或地面平整的填料综合利用；生活垃圾由环卫部门清运处理。

综上，厂区产生的所有固废均得到有效处理或处置，不会对周围环境产生影响。



图 3-4 项目厂区危废间现场照片

3.2.5 其他环境保护设施

(1) 环境风险防范设施

为防止项目建设对地下水、土壤可能造成的污染，建设单位已强化厂区内的防渗措施，具体措施如下：

①源头控制：加强对生活污水的管理，完善了厂区原有设施的检修维护制度，安排专人对厂区环保设施及三废情况的管理。

②防渗措施：厂区道路及混凝土搅拌站处地面已进行了硬化处理。项目沉淀池按照一般防渗区进行建设，等效黏土防渗层 $M_b \geq 1.5\text{m}$ ，渗透系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7}\text{cm/s}$ 。

(2) 规范化排污口、监测设施

本项目废气排污口已按照规范化设置要求进行设置。

4、环评主要结论及环评批复要求

4.1 环境影响报告书（表）主要结论与建议

（1）项目概况

本项目为张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目，主要建设内容为替换原 HZS120 搅拌主机一台，升级改造为 HZS180 搅拌主机，其他配套设施均利旧，项目建成后生产规模为年产混凝土 23 万立方米。

（2）环境影响分析结论

①废气

项目筒仓呼吸粉尘经筒仓顶部除尘设施处理后高空排放；搅拌楼搅拌粉尘经袋式除尘器处理后排放；砂石料库采用封闭式库房，并配有喷淋设施洒水降尘；厂区地面硬化，采取定时清扫洒水措施降低厂区地面及道路运输过程中产生的扬尘；备用柴油发电机使用频率较低，废气产生量较少，对环境影响较小。

通过以上措施，项目有组织排放的颗粒物可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 1 大气污染物最高允许排放浓度限值，厂界颗粒物排放浓度可满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 2 大气污染物无组织排放监控浓度限值。

②废水

本技改项目无新增废水产生。厂区现有废水主要为生活污水及清洗废水。生活污水主要为职工盥洗废水，盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，职工使用厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏。设备清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排。

③噪声

本项目采取隔声、减震、距离衰减等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，噪声对周围环境影响较小。治理措施可行。

④固体废弃物

本项目除尘器收集的粉尘回用于生产；沉淀池沉淀砂石经收集后回用于生产；废混凝土试块收集后回用于生产；生活垃圾由环卫部门清运处理。

（3）项目可行性结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策要求，满足“三线一单”的要求；项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物在满足环评提出各项要求和污染防治措施的基础上，正常运行状态下能够做到达标排放，项目的建设不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小，项目选址可行。在全面加强监督管理，认真落实各项环保措施的前提下，从环保角度分析，项目的建设是可行的。

4.2 审批部门审批意见

2023年12月08日，张家口市行政审批局出具了《张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目环境影响报告表》的审批意见，批文号：张行审立字【2023】628号，主要审批意见如下：

张家口市河山汇德建材有限公司所提交的《张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目环境影响报告表》（污染影响类）已收悉，根据企业委托张家口昊峰环保科技有限公司编制的环境影响报告表及张家口市桥西区行政审批局出具的预审意见，现批复意见如下：

一、张家口市河山汇德建材有限公司拟实施的技术改造项目位于张家口市桥西区马家梁村西1.5km处张家口市河山汇德建材有限公司原厂区院内。项目总投资800万元，其中环保投资40万元。项目不新增占地面积，主要建设内容为替换原HZS120搅拌主机一台，升级改造为HZS180搅拌主机，项目建成后生产规模为年产混凝土23万立方米。其他生产规模、生产工艺、配套设施及治污设施均不发生变化。

在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护设施及措施，确保各类污染物达标稳定排放的前提下，该项目对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制，我局原则性同意你公司按照环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护措施进行项目建设。本报告表及批复可作为该项目建设和管理以及验收的依据。

二、项目建设及运营期应严格落实以下要求：

1、加强施工期环境管理。制定严格的规章制度、合理布置施工现场、安排施工时间，在敏感点附近，应避免夜间施工，确需夜间施工的，应报当地环保部门批准后方可实施。运输车辆采取限速、禁鸣等措施，同时严格落实环评报告中

提出的其它各项噪声振动防治措施，确保施工期噪声满足“《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关限值要求，施工期扬尘须满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中标准要求。确保施工期各项污染物稳定达标排放。

2、项目生活污水须统一排入防渗旱厕，定期由环卫部门清理处置，待城市污水管网接通后须无条件接入；车辆冲洗、搅拌机潜洗废水须统一收集后回用于生产。

3、项目生产使用无需用热、不得新建燃煤设施，上料、搅拌工序产生的颗粒物须经有效处理设施处理后通过各自1根15米高排气筒(DA001、DA002)排放，排放浓度须满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备排放标准要求；筒仓产生的废气须经各自有效外理设施处理后通过各自不低于15米高排气口(DA004-DA015)排放，排放浓度须满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备排放标准要求；厂界颗粒物浓度须满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2中无组织浓度限值要求。物料存储、运输和生产作业须在密闭厂房内，原料、产品堆存须按照《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》(DB13/2352—2016)要求采取有效的防尘抑尘措施。

4、优化生产场区布局，合理布置噪声源。选用低噪生产设备，振动大的设备须加装减振机座及隔音设施，加强设备日常检修，确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

5、项目生活垃圾须分类收集，定期由环卫部门清理处置；不合格品、试验废块、除尘灰、沉淀池沉渣须统一收集后回用于生产；废机油、废机油桶须统一收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位清运处置，危废暂存间的设置及危险废弃物的储存须满足相关技术规范和标准要求。

6、按要求做好生产车间等场所的防渗措施，确保不对地下水产生影响。

7、建设单位要严格落实环评报告中提出的各项环境风险防范措施，确保风险事故情况下的环境安全。

8、项目未发生变化的生产规模、生产工艺、配套设施及治污设施均须遵照

原环评报告及批复执行，不得擅自更改。

三、项目建设必须严格执行“三同时”管理制度。如项目性质、规模、选址或者防止生态破坏、防止污染的措施发生重大变动，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。

四、你公司接到本项目环评文件批复后，应将批准后的环境影响报告表及批复送至相关生态环境行政主管部门，并按规定接受属地生态环境行政主管部门的监督检查。”

4.3 审批意见落实情况

项目审批意见落实情况见下表 4-1。

表 4-1 环评审批意见落实情况

序号	审批意见内容	落实情况
1	建设单位：张家口市河山汇德建材有限公司	建设单位不变
2	建设地点：张家口市桥西区马家梁村西 1.5km 处张家口市河山汇德建材有限公司原厂区内	建设地点不变
3	建设内容：替换原 HZS120 搅拌主机一台，升级改造为 HZS180 搅拌主机，项目建成后生产规模为年产混凝土 23 万立方米。	建设内容不变
4	项目总投资 800 万元，其中环保投资 40 万元	项目投资不变
5	加强施工期环境管理，制定严格的规章制度，合理布置施工现场、安排施工时间。在敏感点附近，应避免夜间施工，确需夜间施工的，应报当地环保部门批准后方可实施。运输车辆采取限速、禁鸣等措施，同时严格落实环评报告中提出的其它各项噪声振动防治措施，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求，施工期扬尘须满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 中标准要求，确保施工期各项污染物稳定达标排放。	已落实，项目施工期较短，加强管理
6	项目生活污水须统一排入防渗旱厕，定期由环卫部门清掏，待市政污水管网接通后须无条件接入市政污水管网；生产废水须循环使用，不外排	已落实
7	项目生产使用无需用热、不得新建燃煤设施，上	已落实，项目筒仓为负压工作

	<p>料、搅拌工序产生的颗粒物须经有效处理设施处理后通过各自1根15米高排气筒(DA001、DA002、DA003)排放,排放浓度须满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备排放标准要求;筒仓产生的废气须经各自有效外理设施处理后通过各自不低于15米高排气口(DA004-DA015)排放,排放浓度须满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备排放标准要求;厂界颗粒物浓度须满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2中无组织浓度限值要求。物料存储、运输和生产作业须在密闭厂房内,原料、产品堆存须按照《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》(DB13/2352-2016)要求采取有效的防尘抑尘措施。</p>	<p>环境,粉尘经仓顶除尘器处理;搅拌楼搅拌粉尘经布袋除尘器处理后高空排放;原料库密闭,喷淋洒水;厂区地面采取硬化措施,并定时洒水清扫;采用密闭传送带。</p> <p>由于冬季公司处于停产状态,因此废气无法满足验收监测条件,待项目后期正常运行后,对厂区废气进行补充监测。</p>
8	<p>优化生产场区布局,合理布置噪声源。选用低噪生产设备,振动大的设备须加装减振机座及隔音设施,加强设备日常检修,确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。</p>	<p>已落实,本项目选用低噪声设备,设置基础减振,厂房隔声措施,但由于冬季公司处于停产状态,因此厂界噪声无法满足验收监测条件,待项目后期正常运行后,对厂界噪声进行补充监测。</p>
9	<p>项目生活垃圾须分类收集,定期由环卫部门清理处置;不合格品、试验废块、除尘灰、沉淀池沉渣须统一收集后回用于生产;废机油、废机油桶须统一收集后暂存于危险废物暂存间内,定期交由有资质的单位清运处置,危废暂存间的设置及危险废弃物的储存须满足相关技术规范和标准要求。</p>	<p>已落实,项目生活垃圾须分类收集,定期由环卫部门清理处置;不合格品、试验废块、除尘灰、沉淀池沉渣须统一收集后回用于生产;项目设置危废间一处,占地约6平方米,2021年9月17日取得改建危废间项目竣工环境保护验收的备案回执,备案号:2021Y-281号。</p>
10	<p>按要求做好生产车间等场所的防渗措施,确保不对地下水产生影响。</p>	<p>已落实</p>

5、验收执行标准

5.1 污染物排放执行标准

(1) 废气：搅拌楼有组织废气排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度限值；厂界废气排放执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值。

(2) 废水：本技改项目无新增废水产生。厂区现有废水主要为生活污水及清洗废水。生活污水主要为职工盥洗废水，盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，职工使用厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏。设备清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排。

(3) 噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(4) 固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中要求。

项目污染物排放执行标准见表6-1。

表6-1 项目验收评价标准一览表

类别	污染源	项目	排放限值	单位	标准来源
废气	生产过程	颗粒物 (有组织)	10	mg/m ³	《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1大气污染物最高允许排放浓度中散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备颗粒物浓度限值
		颗粒物 (无组织)	0.5	mg/m ³	《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值(注：此处标准值指监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1h浓度值的差值)
厂界噪声	Leq	昼间	60	dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准
		夜间	50		

5.2 主要污染物总量控制指标

本项目为技改项目，运营期废气污染物主要为颗粒物，经除尘措施治理后高

空排放；废水污染物主要为生活污水和清洗废水，生活污水泼洒抑尘，清洗废水循环利用。因此，本项目污染物总量指标值为 COD: 0t/a、氨氮: 0t/a、SO₂: 0t/a、NO_x: 0t/a。

6、质量保证措施和监测分析方法

本项目为技改项目，已按照环评文件及审批要求安装环保设施，但由于冬季公司处于停产状态，因此污染源无法满足验收监测条件，待项目后期正常运行后，对废气及噪声进行补充监测。

7、验收检测结果及分析

7.1 污染物排放检测结果

本项目为技改项目，已按照环评文件及审批要求安装环保设施，但由于冬季公司处于停产状态，因此污染源无法满足验收监测条件，待项目后期正常运行后，对废气及噪声进行补充监测。

7.2 污染物排放总量核算

本项目总量指标值为 COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO₂：0t/a、NO_x：0t/a。

8、环境管理检查

8.1 环保管理机构

张家口市河山汇德建材有限公司由专人负责日常环境管理工作，定期巡检环境影响情况，环保设施运行情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法律法规宣传工作。

8.2 施工期环境管理

建设项目施工期对周围环境的影响主要为建筑施工和物料运输过程产生的扬尘、施工噪声、施工期生活污水及施工时产生的固体废物等。通过采取有效治理措施，并合理安排施工时间等以减轻项目建设期对周边环境的影响。施工过程已经结束，影响消失，对周边环境影响已不存在。

8.3 运行期环境管理

建设单位制定了相应的环境管理制度，并且正常履行了试运行期的环境职责，环保设施已安装完毕，但由于冬季公司处于停产状态，因此污染源无法满足验收监测条件，待项目后期正常运行后，对废气及噪声进行补充监测。

8.4 社会环境影响情况调查

经咨询环保主管部门，项目试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

8.5 环境管理情况分析

建设项目施工期已按照环评及审批要求采取了施工期污染防治措施，运营期完善了相应的环境管理制度，并且正常履行了试运行期的环境职责，环保设施已安装完毕，但由于冬季公司处于停产状态，因此污染源无法满足验收监测条件，待项目后期正常运行后，对废气及噪声进行补充监测。

9、结论和建议

9.1 项目验收结论

9.1.1 项目概况

项目名称：张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目

建设单位：张家口市河山汇德建材有限公司

建设性质：技改

工程投资：项目总投资 800 万元，其中环保投资 40 万元，环保投资占总投资比例为 5%。

建设地点：建设项目位于张家口市桥西区马家梁村西 1.5km 处。

建设内容及建设规模：替换原 HZS120 搅拌主机一台，升级改造为 HZS180 搅拌主机，项目建成后生产规模为年产混凝土 23 万立方米。

9.1.2 项目验收结论


张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目在施工期和试运行期执行了环境保护“三同时”制度，落实了该项目环境影响评价报告表和环保主管部门的批复要求。根据该项目施工期环境影响调查结果，该项目对施工期间产生的废气、废水、噪声及固体废物均采取了相应的处理及处置措施，对周围环境影响较小。试运行期间通过对项目现场检查发现项目已按照环评报告及审批意见要求完善相关环保设施，项目筒仓呼吸粉尘经筒仓顶部除尘设施处理后不低于 15m 排气口排放；搅拌楼搅拌粉尘经袋式除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放；砂石料库采用封闭式库房，并配有喷淋设施洒水降尘；厂区地面硬化，采取定时清扫洒水措施降低厂区地面及道路运输过程中产生的扬尘；备用柴油发电机使用频率较低，废气产生量较少；盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，职工使用厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏。设备清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排。项目采取隔声、减震、距离衰减等降噪措施；项目除尘器收集的粉尘回用于生产；废混凝土试块、沉淀池沉淀砂石经收集后回用于生产；生活垃圾由环卫部门清运处理。

按照生态环境部关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定，该项目具备工程竣工环境保护验收条件。


综上所述，同意张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目通过竣工环境保护验收。

9.2 建议

- (1) 完善各项管理制度，确保各项污染治理设施稳定运行。
- (2) 待项目后期正常运行后，对废气及噪声污染源进行补充监测。

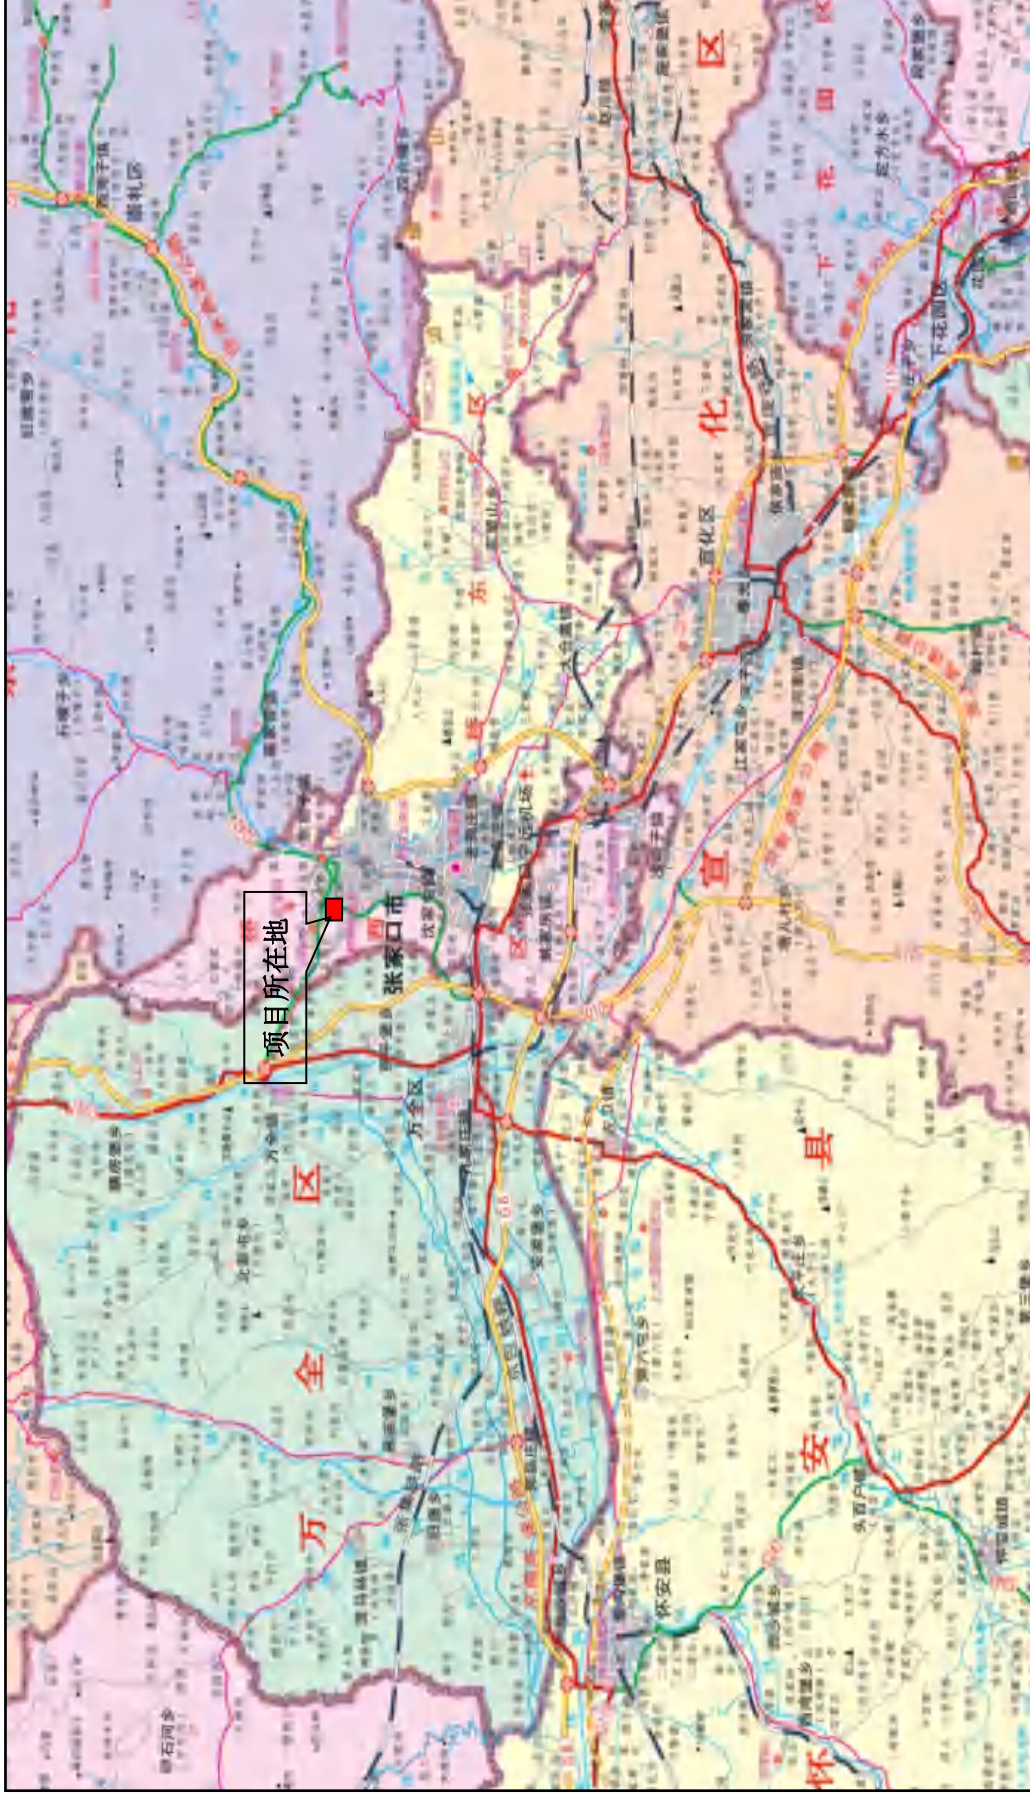

项目地理位置图

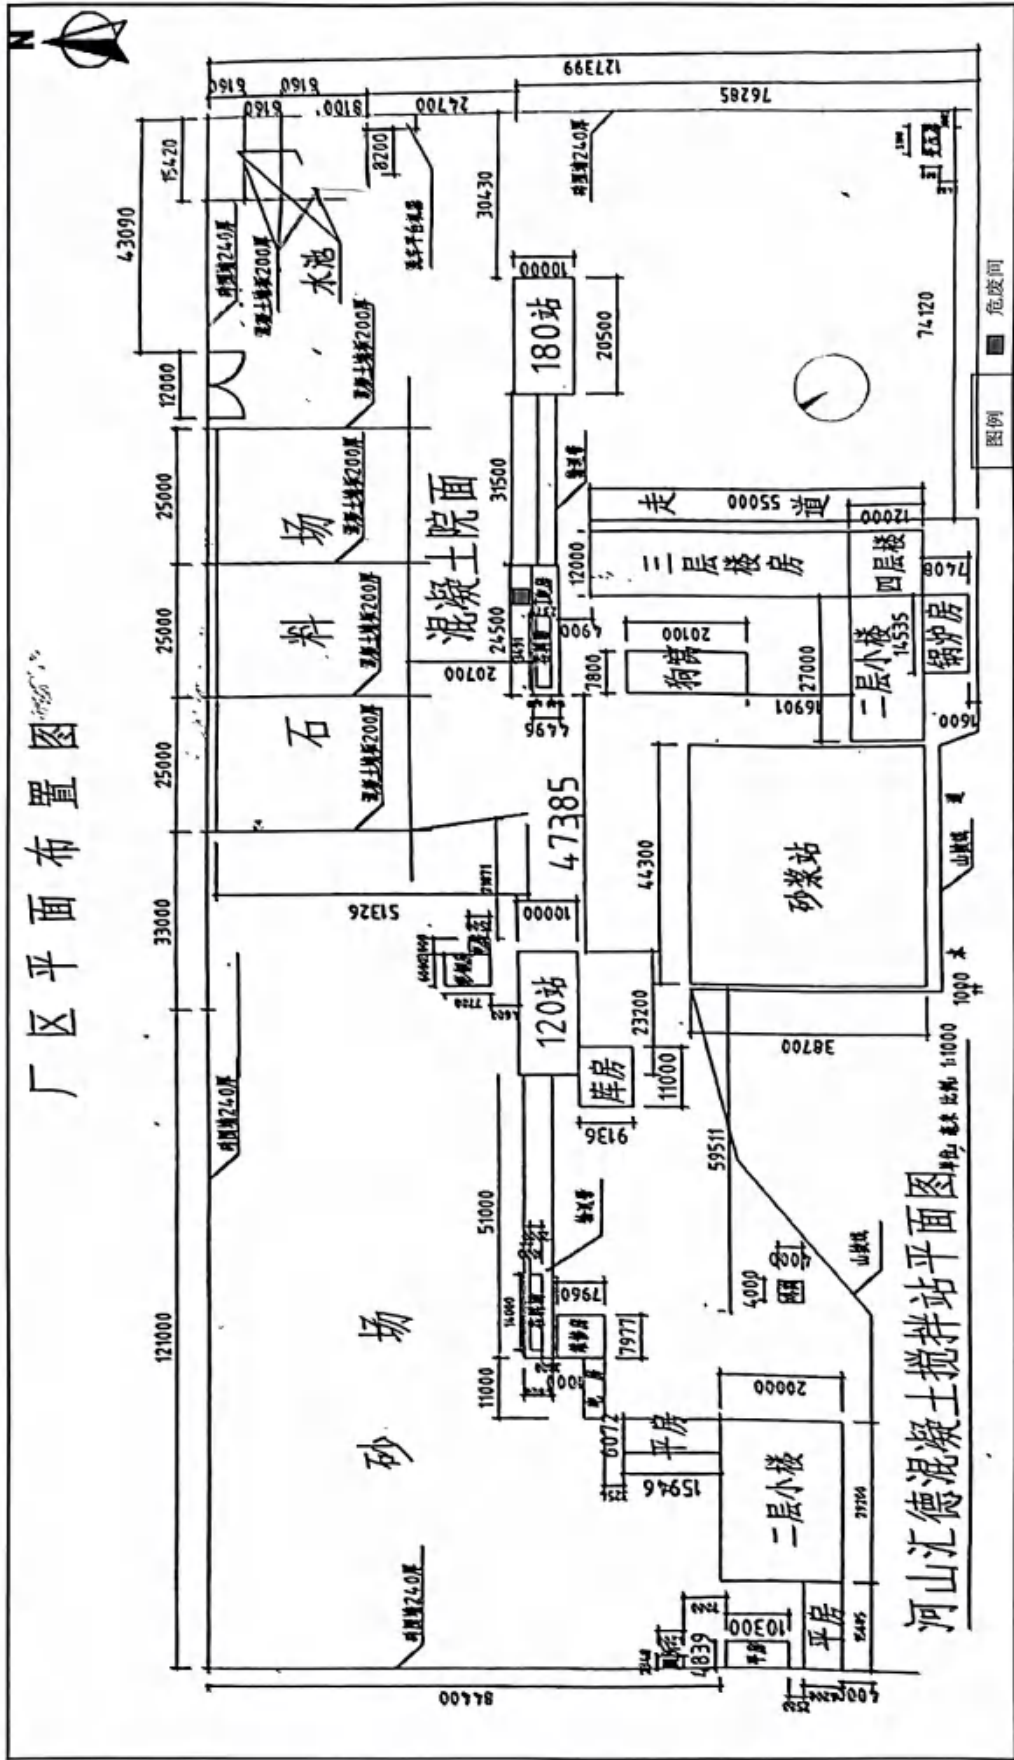

附图 2 平面布置图



项目周边关系图

统一社会信用代码
911307036827697050

营业执照

(副本)
副本编号: 1-1

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
备案、许可、监
管信息。



名称 张家口市河山汇德建材有限公司

注册资本 贰仟陆佰万元整

类型 有限责任公司(自然人独资)

成立日期 2008年12月05日

法定代表人 李春辉

营业期限 2008年12月05日至 2041年12月04日

经营范围 商品混凝土、预拌砂浆、水泥路面砖、保温材料、保温材料、聚氨酯防水涂料的制造、销售，建筑材料的销售，工程专业承包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 张家口桥西区马家梁村



登记机关
2021年9月30日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

附件 1 营业执照



电话: 17363138666

张家口市桥西区行政审批局文件

西行审核字（2023）118号

张家口市桥西区行政审批局 关于张家口市河山汇德建材有限公司 混凝土搅拌站技改项目的备案信息

张家口市河山汇德建材有限公司关于张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目的备案信息变更如下：

项目名称：张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目。

项目建设单位：张家口市河山汇德建材有限公司。

项目建设地点：张家口市桥西区马家梁村西 1.5km 处。

主要建设规模及内容：技改项目替换原 HZS120 搅拌主机一台，升级改造为 HZS180 搅拌主机，其他配套设施均利旧。项目技改后年产规模不变仍为年产混凝土 23 万立方米。

项目总投资：800 万元，其中项目资本金为 160 万元，项目资本金占项目总投资的比例为 20%。

项目信息发生较大变更的，企业应当及时告知备案机关。

西行审核字（2023）108 号的备案信息无效。

注：项目自备案后 2 年内未开工建设或者未办理任何其他手续的，项目单位如果决定继续实施该项目，应当通过河北省投资项目在线审批监管平台作出说明；如果不再继续实施，应当撤回已备案信息。

桥西区行政审批局

2023 年 11 月 20 日

行政审批专用章

1307012004432



固定资产投资项 目

2311-130703-89-05-720351

桥西区行政审批局

2023 年 11 月 20 日

固定污染源排污登记回执

登记编号：911307036827697050001Z

排污单位名称：张家口市河山汇德建材有限公司

生产经营场所地址：张家口桥西区马家梁村

统一社会信用代码：911307036827697050

登记类型：首次 延续 变更

登记日期：2020年05月29日

有效期：2020年05月29日至2025年05月28日



注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号

证 明

张家口市河山汇德建材有限公司于2009年6月18日吸收合并张家口市颐兴商品混凝土有限公司，吸收合并后，张家口市河山汇德有限公司为存续公司，张家口市颐兴商品混凝土有限公司于2009年8月3日依法注销。

张家口市桥西区工商行政管理局注册科

2013年5月20日



情况说明

张家口市河山汇德建材有限公司位于张家口市桥西区马家梁村，该公司生产经营的土地于2011年取得了国有土地使用证，证号：张市西国用【2011】第008号，城市规划用途为工业用地。

张家口市自然资源和规划局桥西分局

2023年8月16日



审批意见:

一、张家口市河山汇德建材有限公司建设的《混凝土搅拌站》项目，位于张家口市桥西区马家梁村，占地面积 23942.3 平方米，总投资 110 万元，经局项目领导小组研究，建设单位在认真落实环评报告表提出的环境保护措施后，从环境保护角度，同意该项目建设。

二、项目建设、运行期环境管理必须严格执行和落实好以下几方面工作：

(一)、加强施工期管理，对产生的大气污染物必须采取有效控制。

项目仓储设施和生产经过各阶段工序产生的粉尘必须设有集气罩进行收集，再经负压吸风收尘装置引致布袋除尘器进行除尘处理；砂石堆料场采取挡风抑尘网并加装喷淋装置，降低无组织粉尘排放；对厂区内地面进行定时清洗，保持地面清洁，降低地面动力起尘。

(二)、机械设备必须加装减震装置，生产过程中产生的噪声需达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准。

(三)、项目运行中产生的固废全部回用于生产，生活垃圾要分类收集并及时清运。

(四)、项目在建设中要对区域内进行统一绿化，并制定切实可行的方案，认真落实，确保绿化实施。

(五)、该项目总量控制指标为 SO₂ 排放量为 0 吨/年，NO_x 排放量为 0 吨/年。

三、建设单位要切实执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，按规定程序向我局申请项目竣工环境保护验收。验收合格后，方可正式投入使用。项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，否则承担相应环保法律责任。

四、该《报告表》自批准之日起满 5 年，建设项目方开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。



验收意见:

张行审立字[2018] 484号

张家口市河山汇德建材有限公司关于《混凝土搅拌站项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的申请》及附送的《张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站项目竣工环境保护验收报告》(以下简称《验收报告》)等材料收悉。我局及张家口市环境保护局桥西分局相关人员对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查,并列席参加该项目验收会议。经研究,提出验收意见(噪声和固体废物)如下:

一、项目建设的基本情况

张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站项目(以下简称该项目)位于张家口市桥西区马家梁村,占地面积23942.30m²。建设内容包括原料仓、搅拌楼、办公室、库房及化验室等,建设1条混凝土生产线,年产混凝土20万m³。项目总投资110万元,其中环保投资48万元。

2014年4月3日,张家口市环境保护局桥西分局批复了该项目环境影响报告表。该项目2016年1月开工建设,2016年6月工程建设结束,目前全线投产试运行,配套建设的环境保护设施已基本同步投入使用。

二、工程变动有关情况

经现场调查和与建设单位核实,该项目变更内容如下:搅拌工序由降尘室+二级布袋除尘器+15高排气筒变更为降尘室+二级布袋吸尘设施;料仓全部变为全密闭料仓。以上变动不属于重大变更。

三、噪声和固体废物污染防治设施落实情况

(一)该项目施工中选用低噪声施工机械,合理布置施工机械位置降低项目噪声对外环境的影响;合理安排施工作业时间,未进行夜间施工作业。对高噪声设备采取了隔声、减振等综合降噪措施,确保厂界噪声达标。

(二)施工期建筑垃圾与生活垃圾分类存放,由环卫部门进行处理;运营期间产生的除尘灰及沉淀池的污泥经收集后回用于生产,生活垃圾集

中收集，统一由环卫部门清运。

四、噪声和固体废物污染防治设施运行效果

张家口市环境科技发展有限公司编制的《验收报告》表明：

(一) 厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准要求。

(二) 该项目固体废物处置措施基本落实到位，固体废物得到了妥善处置。

五、验收结论和后续要求

该项目在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复要求配套建设了相应的噪声和固体废物污染防治设施。经研究，我局同意该项目噪声和固体废物环境保护设施验收合格。

你公司应按照环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对该项目其它环境保护设施开展竣工环境保护验收，验收合格后，主体项目方可正式投入运营。项目正式投入运营后应加强噪声、固体废物环境保护设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

你公司须按规定接受各级环境保护主管部门的环境保护日常监管。

经办人：

李强



审批意见:

原则同意张家口市颐兴建筑材料有限公司“混凝土搅拌站”建设项目环境影响报告表及其专项评价所采用的标准和结论意见,同意项目建设。该报告表可以作为项目设计和环境管理的依据。

要认真落实报告表提出的各项环境保护措施,加强施工期和运营期的环境管理。确保各项污染物稳定达标排放。

为了确保赐儿山风景区的景观不受影响,建设单位不得使用该景区视线之内所开采的石料,不得随意破坏景区视线之内的绿化林带。运输车辆应尽量不走通往景区的道路。必须通过景区的车辆要做好防尘防漏,确保景区及其道路沿线景观不受本项目的不良影响。

本项目总量控制指标分别为:粉尘 0.4 吨/年;烟尘 0.2 吨/年;二氧化硫 0.86 吨/年。

本项目建成后在试生产三个月内向我局提出竣工环境保护验收申请,经我局验收合格后方可正式投入生产。

经办人



负责验收的环境行政主管部门验收意见:

环验 () _____ 号

同意验收组对张家口市颐兴建筑材料有限公司“新建混凝土搅拌站”建设项目竣工环境保护验收组意见通过该项目竣工环境保护验收。

必须做到以下四点:

- 1、加快厂区地面硬化, 加快厂区周围绿化建设。
 - 2、对储料场所采用洒水降尘或覆盖防尘网措施, 加强防尘管理。
 - 3、加强运营期间各输送工序的扬尘治理措施, 粉尘的排放量不得超过 0.4t/a。
 - 4、锅炉在使用当中用低流煤和添加剂, 以降低 SO₂ 排放量。
- 建设单位要认真落实各项环境保护措施, 加强管理确保各项污染物稳定达标排放。

经办人(签字): 秦利君



3 日

建设项目环境影响登记表 (表四)

项目排污情况及环保措施:

审批意见:

一、该项目由原张家口市颐兴建筑材料有限公司变更为张家口市河山汇德建材有限公司，法人由原李金福变更为何海，其生产规模、生产工艺、设备、厂址、排污情况、防治措施未做变动。

二、建设单位必须按照原环境影响评价报告表及其有关批复要求实施环境管理。

经局项目领导小组研究，同意做出变更



审批意见:

张行审立字(2021)73号

张家口河山汇德建材有限公司所提交《张家口河山汇德建材有限公司改建危废储存间项目环境影响报告表》已收悉,根据企业委托河北华睿风翰环保科技有限公司编制的环境影响报告表结论及桥西区行政审批局出具的预审意见,现批复意见如下:

一、张家口河山汇德建材有限公司拟建设的张家口河山汇德建材有限公司改建危废储存间项目位于张家口桥西区马家梁村。项目在原有厂内建设,不新增占地。项目总投资3万元,其中环保投资3万元。项目改建危废间一座及其附属设施。其他生产规模、生产工艺、配套设施及治污设施均不发生变化。

在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护设施及措施,确保各类污染物达标稳定排放的前提下,该项目对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制,我局原则性同意你院按照环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护措施进行项目建设。本报告表及批复可作为该项目建设 and 环境管理以及验收的依据。

二、项目建设及运营期应严格落实以下要求:

1、加强施工期环境管理,制定严格的规章制度,合理布置施工现场、安排施工时间。在敏感点附近,应避免夜间施工,确需夜间施工的,应报当地环保部门批准后方可实施。运输车辆采取限速、禁鸣等措施,同时严格落实环评报告中提出的其它各项噪声振动防治措施,确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相应标准要求,施工期扬尘须满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1标准要求,确保施工期各项污染物稳定达标排放。

2、项目生产过程中无生产废水产生。

3、项目冬季无需采暖,不得新建燃煤设施。危废采用密闭装卸、储存方式。厂界有机物废气浓度须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2中企业边界浓度限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1限值要求。

4、优化生产场区布局,合理布置噪声源。选用低噪生产设备,振动大的设备须加装减振机座及隔音设施,加强设备日常检修。确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

5、废机油、废机油桶须统一暂存于危废暂存间,定期交由有资质的单位清理处置,危险废物的暂存及处置须满足相关技术规范 and 标准要求。

6、做好厂地等场所的防渗措施,确保不对地下水产生影响。做好环境风险防范措施。

7、项目未发生变化的生产规模、生产工艺、配套设施及治污设施均须遵照原环评报告及批复执行,不得擅自更改。

三、项目建设必须严格执行“三同时”管理制度。如项目性质、规模、选址或者防止生态破坏、防止污染的措施发生重大变动,应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。

四、你公司接到本项目环评文件批复后,应将批准后的环境影响报告表及批复送至相关生态环境行政主管部门,并按规定接受属地生态环境行政主管部门的监督检查。

经办人: 赵建楠

李强



张家口市行政审批局

备案：2021Y-281 号

张家口市行政审批局

关于张家口市河山汇德建材有限公司

改建危废储存间项目竣工环境保护验收的备案回执

张家口市河山汇德建材有限公司：

依据冀环办字函[2017]727 号文规定，你单位该项目竣工环境保护验收备案资料如下：

- 1、建设项目环境保护设施验收报告。
- 2、建设项目环境保护措施“三同时”落实情况表。
- 3、项目主体工程及环保设施现场彩色照片。
- 4、污染治理设施管理岗位责任制度和维修保养制度。
- 5、排污口规范化设置情况说明。
- 6、危险废物委托有资质单位处置的协议及接收单位的资质复印件。
- 7、竣工相关图件。
- 8、其他相关材料。

你单位须按规定接受各级生态环境主管部门的环境保护日常监管，并将该项目竣工环境保护验收资料报相关生态环境主管部门备案。

张家口市行政审批局

2021年9月17日



预审意见:

张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站改扩建项目，位于张家口桥西区马家梁村西 1.5km 处。建设内容:：技改项目替换原 HZS120 搅拌主机一台，升级改造为 HZS180 搅拌主机，其他配套设施均利旧。项目技改后年产规模不变仍为年产混凝土 23 万立方米。

该项目符合国家产业政策，选址合理，满足“三线一单”要求，不存在“未批先建”问题。报告表结论和建议合理可靠，我局原则上同意该项目上报张家口市行政审批局受理审批。

经办人:

王亚平 高妍

桥西区行政审批局

2023 年 11 月 23 日



审批意见:

张行审立字[2023]628号

张家口市河山汇德建材有限公司所提交的《张家口市河山汇德建材有限公司混凝土搅拌站技改项目环境影响报告表》(污染影响类)已收悉,根据企业委托张家口昊峰环保科技有限公司编制的环境影响报告表及张家口桥西区行政审批局出具的预审意见,现批复意见如下:

一、张家口市河山汇德建材有限公司拟实施的混凝土搅拌站技改项目位于张家口市桥西区马家梁西1.5km处。项目总投资800万元,其中环保投资40万元。项目不新增占地面积,项目替换原HZS120搅拌主机一台,升级为HZS180搅拌主机。项目建成后年产混凝土23万立方米。其他生产规模、生产工艺、配套设施及治污设施均不发生变化。

在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护设施及措施,确保各类污染物达标稳定排放的前提下,该项目对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制,我局原则性同意你公司按照环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护措施进行项目建设。本报告表及批复可作为该项目建设 and 环境管理以及验收的依据。

二、项目建设及运营期应严格落实以下要求:

1. 加强施工期环境管理。制定严格的规章制度,合理布置施工现场、安排施工时间。在敏感点附近,应避免夜间施工,确需夜间施工的,应报当地环保部门批准后方可实施。运输车辆采取限速、禁鸣等措施,同时严格落实环评报告中提出的其它各项噪声振动防治措施,确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相关限值要求,施工期扬尘须满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中标准要求,确保施工期各项污染物稳定达标排放。

2. 项目生活污水须统一排入防渗旱厕,定期由环卫部门清理处置,待市政管网接通后须无条件接入市政污水管网;车辆、设备清洗废水须统一收集后回用于生产。

3. 项目生产使用无需用热,不得新建燃煤设施。上料、搅拌工序产生的颗粒物须经有效处理设施处理后通过各自1根15米高排气筒(DA001、DA002)排放,排放浓度均须满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备排放标准要求;筒仓产生的废气须经各自有效处理设施(每两个筒仓合用一套除尘设备)处理后通过各自15米高排气筒(DA003-DA010)排放,排放浓度均须满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产水泥仓及其他通风生产设备排放标准要求;厂界颗粒物浓度须满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2中无组织浓度限值要求。物料存储、运输和生产作业须在密闭厂房内,原料、产品堆存须按照《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》(DB13/2352-2016)要求采取有效的防尘抑尘措施。

4. 优化生产场区布局,合理布置噪声源。选用低噪生产设备,振动大的设备须加装减振机座及隔音设施,加强设备日常检修,确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

5. 项目生活垃圾须分类收集,定期由环卫部门清理处置;除尘灰、不合格产品、试验废块、沉淀池沉渣须统一收集后回用于生产;废机油、废机油桶须统一收集后暂存于危废暂存间内,定期交由有资质的单位清运处置。危废暂存间的设置及危险废弃物的储存须满足相关技术规范 and 标准要求。

6. 按要求做好生产车间等场所的防渗措施,确保不对地下水产生影响。

7. 建设单位要严格落实环评报告中提出的各项环境风险防范措施,确保风险事故情况下的环境安全。

8. 项目未发生变化的生产规模、生产工艺、配套设施及治污设施均须遵照原环评报告及批复执行,不得擅自更改。

三、项目建设必须严格执行“三同时”管理制度,如项目性质、规模、选址或者防止生态破坏、防止污染的措施发生重大变动,应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。

四、你公司接到本项目环评文件批复后,应将批准后的环境影响报告表及批复送至相关生态环境行政主管部门,并按规定接受属地生态环境行政主管部门的监督检查。

经办人: 杨飞 赵建楠

(盖章)

2023年12月8日
